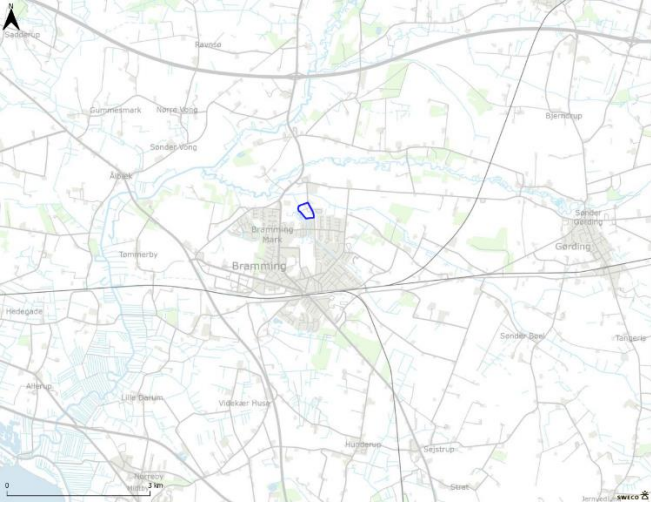


Bilag 1

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Ifm. byggemodning på matr.nr. 1axg, Bramming Hgd., Bramming skal der etableres nedsivningsbassiner, som kan opsamle overfladevand fra asfalterede vejarealer og tagvand fra bebyggelse i et vandhåndteringssystem. Nedsivningsbassinerne vil blive tilpasset det omkringliggende landskab.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Bo Christensen ApS, Arkitektfirma. Vester Kær 16, 6950 Ringkøbing Bo Asbjørn Christensen, bac@bochristensen.dk , +45 4043 6620.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Sweco A/S, Willemoesgade 13K, 8200 Aarhus. Sara Michaela Havlund, saramichaela.havlund@sweco.dk , +45 42821984
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Tværsigvej 31, 6740 Bramming 1axg, Bramming Hgd., Bramming
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Projektet er beliggende i Esbjerg Kommune.
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	 Projektområdet er indenfor den blå markering. Se bilag 1.

Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).



Projektområdet er markeret med blå, og nedslivningsbassinerne er markeret med lyseblå. Det nordlige bassin er projekteret som et tæt regnvands- og forsinkelsesbassin, hvor afledning af overfladevand sker via volumenopmagasinering uden nedslivning. Det sydlige bassin etableres som et nedslivningsbassin, hvor overfladevand nedslives til undergrunden.

Se bilag 2.

Forholdet til VVM reglerne

Ja **Nej**

Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).

X

Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:

Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

X

Hvis ja, angiv punktet på bilag 2:
10. INFRASTRUKTURPROJEKTER
g) Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

Tekst

1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav

Gartneriet ApS er ejer af arealet.
Ådalsvej 2, 6690 Gørding.

2. Arealanvendelse efter projektets realisering.

Nedslivnings- og forsinkelsesbassiner til opsamling af overfladevand fra asfalterede vejarealer og tagflader.

Det fremtidige samlede bebyggede areal i m²:

Bebyggelsens omfang fremgår af [Lokalplan nr. 21-040-0007](#).

Det fremtidige samlede befæstede areal i m²:

26.818 m² (hele projektområdet).

Nye arealer, som befæstes ved projektet i m²:

14.359 m² (hele projektområdet).

3. Projektets areal og volumenmæssige udformning


Det nordlige bassin er projekteret som et tæt regnvands- og forsinkelsesbassin, hvor afledning af overfladevand sker via volumenopmagasinering uden nedslivning. Det sydlige bassin etableres som et nedslivningsbassin, hvor overfladevand nedslives til undergrunden. Det sydlige nedslivningsbassin vil have et bundareal på 2520 m², en kronekant på 3420 m², en dybde på 0,49 m og et opstuvningsvolumen på 1226 m³.


Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m

Ingen.

Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m²:	3420 m² (det sydlige nedsivningsbassin).
Projektets bebyggede areal i m²:	0 m².
Projektets nye befæstede areal i m²:	0 m².
Projektets samlede bygningsmasse i m³:	0 m³.
Projektets maksimale bygningshøjde i m:	0 m.
Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet:	Ingen.
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden	Der forventes ingen brug af råstoffer i anlægsperioden til etablering af nedsivningsbassinerne.
Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:	Ingen.
Vandmængde i anlægsperioden	Ingen.
Affaldstype og mængder i anlægsperioden	Ingen.
Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden	Ingen.
Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden	Ingen.
Håndtering af regnvand i anlægsperioden	Evt. tilstrømmende regnvand nedsives.
Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	01/26-04/26.
Projektets karakteristika	Tekst
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:	Ingen.
Råstoffer – type og mængde i driftsfasen	
Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen	
Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen	

Vandmængde i driftsfasen	Anslåede årlige mængder overfladevand: 925 m ³ /år.		
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Ingen. Ingen.		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?	-	-	Ikke relevant.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	-	-	Ikke relevant.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	-	-	Ikke relevant.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X		<i>Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder og overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner i Esbjerg og Fanø Kommune, juni 2012.</i> Forskrift - miljømæssige krav for bygge- og anlægsarbejde <i>Vejledning om regulering af visse midlertidige aktiviteter, Miljøstyrelsen, december 2017.</i> Vejledning <i>Ekstern støj fra virksomheder, Miljøstyrelsen, november 1984.</i> Vejledning
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Arbejdet vil ske indenfor normal arbejdstid. Normal arbejdstid er hverdage fra klokken 07 til klokken 18 samt lørdage fra klokken 08 til klokken 15.
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.

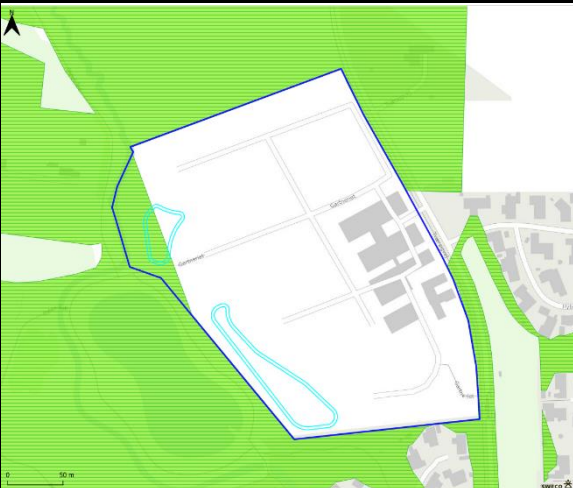18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	-	-	Ikke relevant, ingen emissioner.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	-	-	Ikke relevant, ingen emissioner.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?	X		I anlægsperioden vil der kunne forekomme en mindre støvpåvirkning som følge af gravearbejde mv. I driftsfasen vil der ikke være støvgener.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og natetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Arbejdet vil ske indenfor normal arbejdstid. Ingen.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Projektområdet er en del af lokalplan nr. 21-040-0007: <i>Boligområde på den gamle Gartnerigrund, Tværsigvej, Bramming</i> , vedtaget 2. september 2024. Lokalplan nr. 21-040-0007
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	X		 Projektområdet er markeret med blå, nedsivningsbassinene er markeret med lyseblå, og skovbyggelinjen er markeret med grøn skravering. Et mindre område indenfor projektområdets nordvestligste hjørne er indenfor skovbyggelinjen. Projektet forudsætter dispensation fra skovbyggelinjen for etablering af det nordlige nedsivningsbassin.

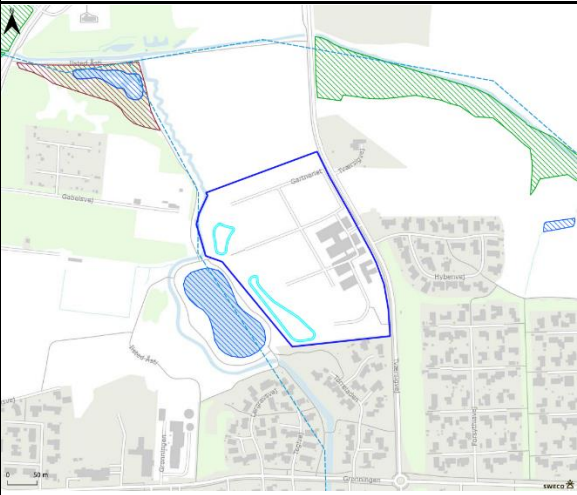
			Nærmeste åbeskyttelseslinje er 34 m nord for projektområdet. Nærmeste kirkebyggelinje er 48 m nordvest for projektområdet.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			 Nærmeste §3-beskyttede sø er 13 m sydvest for projektområdet (blå skravering). Nærmeste §3-beskyttede eng er 89 m nordøst for projektområdet (grøn skravering). Nærmeste §3-beskyttede mose er 137 m nordvest for projektområdet (brun skravering). Nærmeste §3-beskyttede vandløb overlapper et mindre område i det nordvestlige hjørne af projektområdet (lyseblå stiplede linje). Projektområdet er markeret med blå, og nedslivningsbassinerne er markeret med lyseblå.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	Der er ingen beskyttede arter indenfor projektområdet. Der er foretaget en søgning indenfor 2 km fra projektområdet, hvor validerede fund indenfor de seneste ti år er medtaget. Der er søgt på arter.dk d. 1. maj 2026. Der er registreret odder (bilag IV) 804 m nord for projektområdet i 2022 og ligeledes 1,0 km syd for projektområdet i 2019 samt 1,6 km nordvest for projektområdet i 2017. Der er registreret grøn kølleuldsmed 1,6 km nordvest for projektområdet i 2024. Der er generelt observeret flere fugle i området omkring projektområdet; herunder isfugl, som er kategoriseret som sårbar (VU) på den danske rødliste, er observeret knap 10 m vest for projektområdet i 2017.

33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.



Nærmeste fredede område er Sneum kirke 4,3 km sydvest for projektområdet (lyseblå skravering). Projektområdet er markeret med blå, og nedsivningsbassinerne er markeret med lyseblå.

34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).

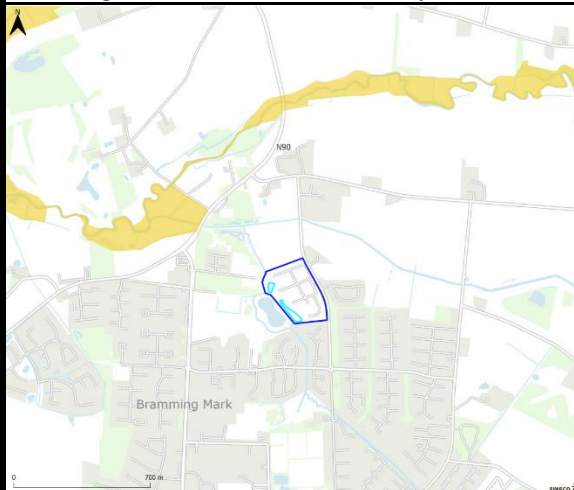

Nærmeste naturbeskyttelsesområde er natura-2000 området, Sneum Å og Holsted Ådal (N90), beliggende 410 m nordvest for projektområdet (gul markering). Området er habitatområde Sneum Å og Holsted Ådal (H79). Projektområdet er markeret med blå, og nedsivningsbassinerne er markeret med lyseblå.


35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?

X

Projektet omfatter nedsivning af overfladevand fra asfalterede vejarealer og tagvand fra bebyggelse til nedsivningsbassiner, som tilpasses landskabet. De øverste 30 cm af nedsivningsbassinet vil bestå af muld med en tilstrækkelig absorptionskapacitet til, at nedsivningen af tag- og overfladevand ikke udgør en væsentlig påvirkning af vådområder eller grundvandsforekomster.

36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?


X

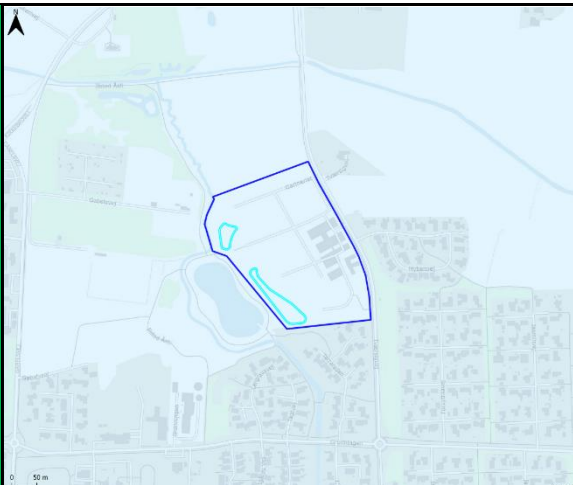

Projektområdet er placeret udenfor et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), men indenfor et område med drikkevandsinteresser (OD). Projektområdet er markeret med blå, og nedslivningsbassinerne er markeret med lyseblå.

37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?

X

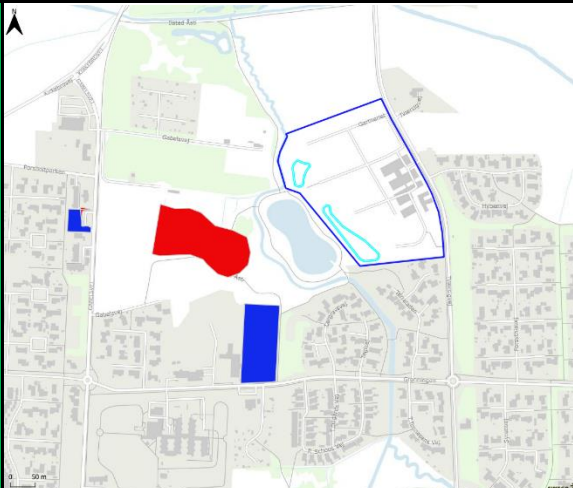

Nærmeste offentligt registrerede V1-kortlagte område er 180 m sydvest for projektområdet (blå markering).
Nærmeste offentligt registrerede V2-kortlagte område er 122 m vestsydvest for projektområdet (rød markering).
Projektområdet er markeret med blå, og nedslivningsbassinerne er markeret med lyseblå.

38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	X	 Den vestlige del af projektområdet overlapper med et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse (lilla markering). Projektområdet er markeret med blå, og nedsivningsbassinerne er markeret med lyseblå.
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	X	
Projektets placering	Ja Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative)?	X	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?	X	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?		Der vurderes ikke at være væsentlige påvirkninger af miljøet forbundet med projektet.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.



Dato: 12/5/26 Bygherre/anmelder: Søren Michael H. Jensen

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angive miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

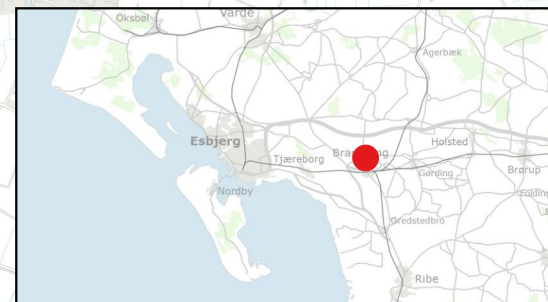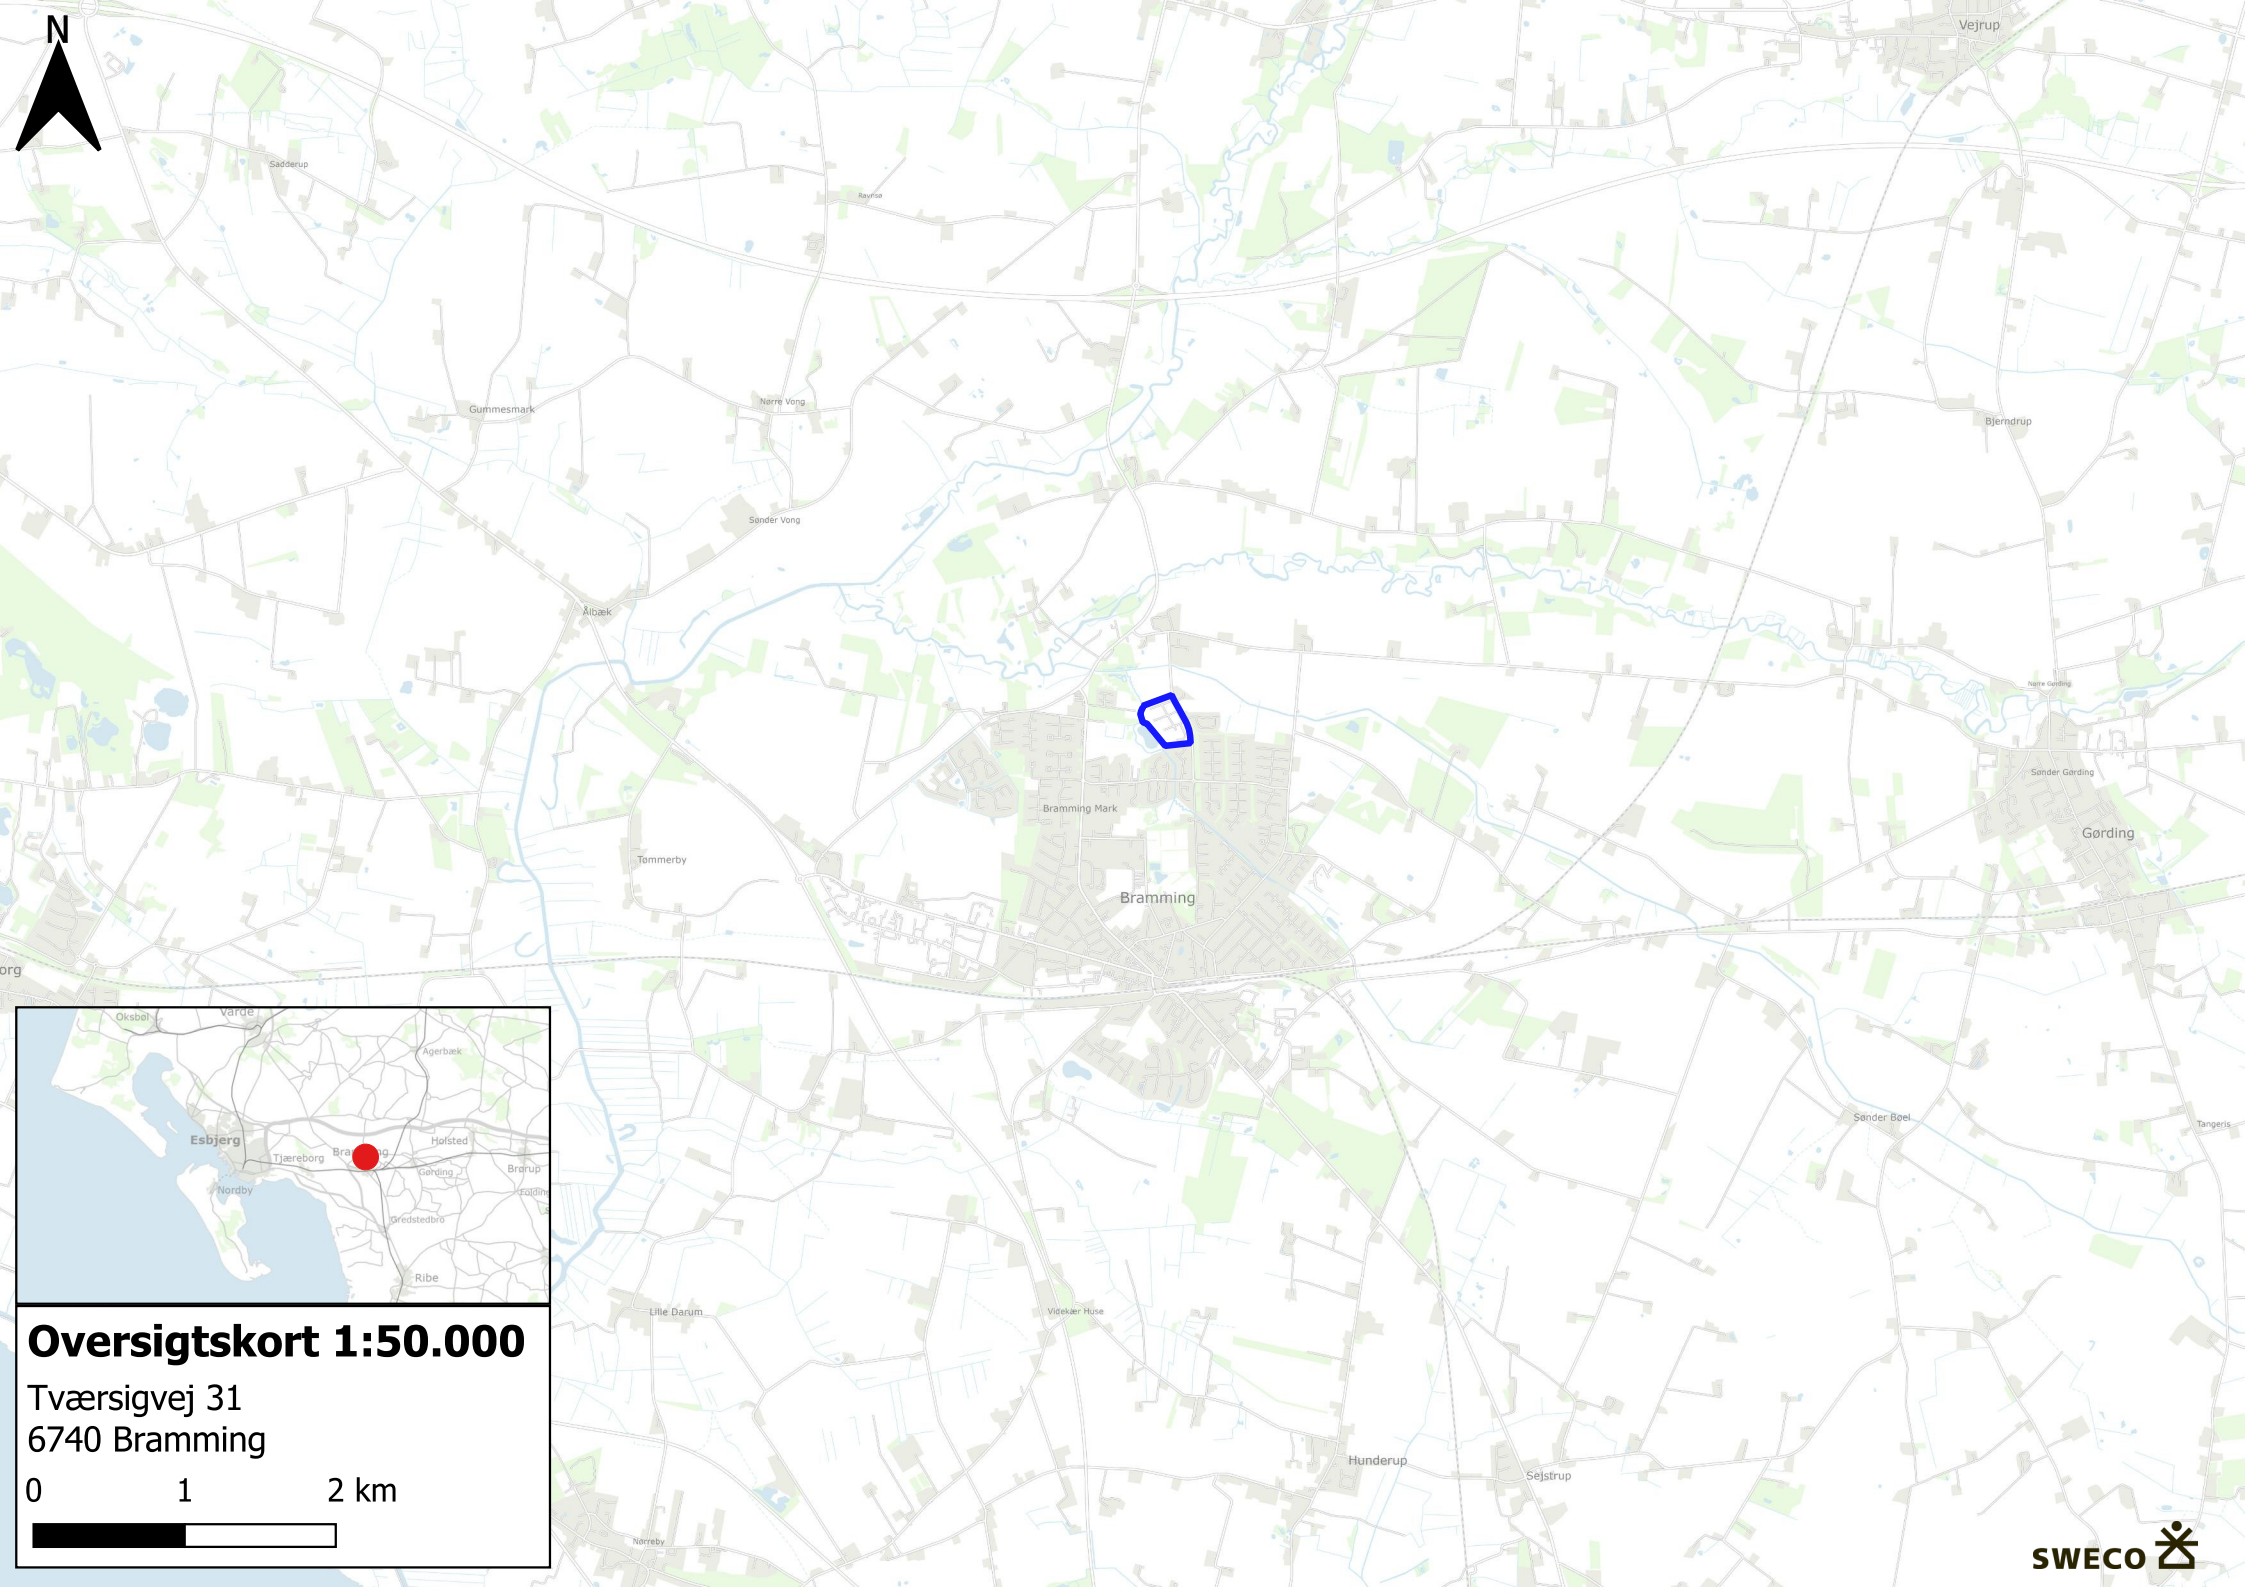

Oversigtskort 1:50.000

Tværsigvej 31
6740 Bramming

